


# Campus Glashütte

## Status-Quo




Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte		21.11.2018
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AFSuS		03./17.03.2021
	Beauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren		Juli 2021
	Einreichung Bauantrag	● Januar '24	
	Baubeginn Sporthallen und Schulen	● Herbst '24	
	Fertigstellung Sporthallen	● Sommer '27	
	Fertigstellung Schulen	● Sommer '27	
	Gesamtfertigstellung	● Herbst '28	



Projektstatus
- Bearbeitung Leistungsphase 3 seit 18.07.2022, Abschluss Entwurfsplanung Ende September
- regelmäßige Abstimmungen mit den Planern, Nutzern und Amt 68
- regelmäßige inhaltliche Abstimmungen zum B-Plan
- Fördermittelantrag in Höhe von brutto ca. € 1.30 Mio. wurde bewilligt
- Hochbauten zur DGNB-Zertifizierung angemeldet




Projektkosten	Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt
---------------	--

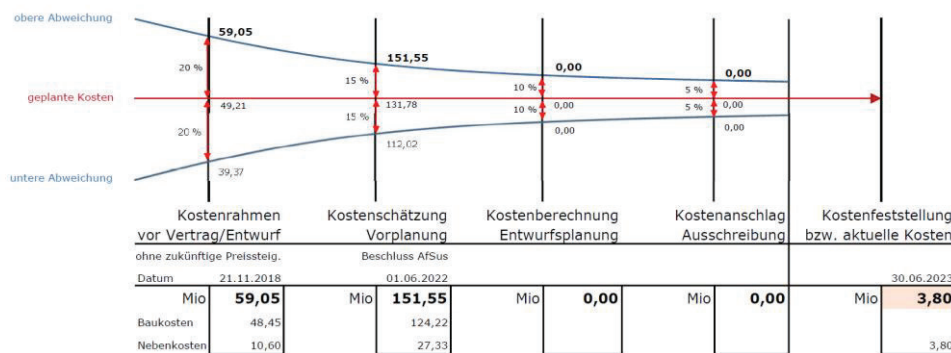

02.08.2023

# Grundschule Aurikelstieg

## Status Quo

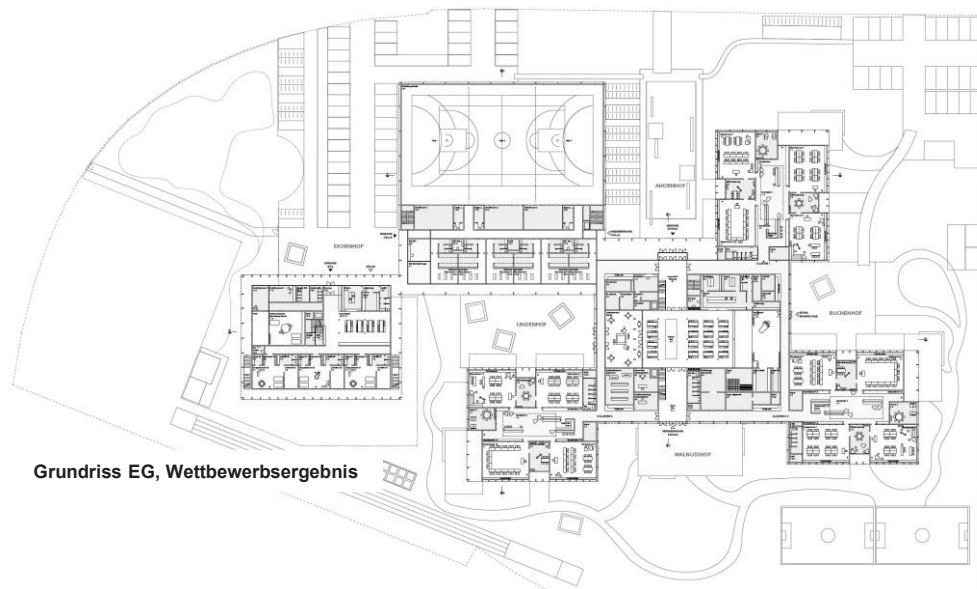

[www.egno.de/aurikelstieg](http://www.egno.de/aurikelstieg)

Link zu allen Wettbewerbsergebnissen
