

# Anlage 3

Abschlussbericht II/2021 408 HB DFS



Entwicklungsgesellschaft  
Norderstedt mbH

## Projektdaten


Neubau einer Dreifeldsporthalle mit Dojo

gust@egno.de

Am Exerzierplatz 28, 22848 Norderstedt

040-535 406 50


Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau der Halle im AfSS		06.09.2017
	Beauftragung der Architekten		25.09.2018
	Abriss der alten Halle fertig		07.01.2019
	Einreichung des Bauantrages		19.02.2019
	Baugenehmigung	Ende Mai 2019	
	Baubeginn	● November '19	20.11.2019
	Fertigstellung ohne Ausstattung	Februar '21	-
	Fertigstellung mit Ausstattung	● April '21	07.05.2021



## Projektstatus

- Baubeginn nach Kostenfreigabe 02.10.2019 am 20.11.2019
- Arbeiten sind abgeschlossen
- Schlüsselübergabe am 07.05.2021
- Schlussabrechnung ist in Vorbereitung
- Beginn der Bewirtschaftung
- offen: Herstellung des Radweges durch die Stadt Norderstedt geplant

## Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt ohne zukünftige Preissteigerung

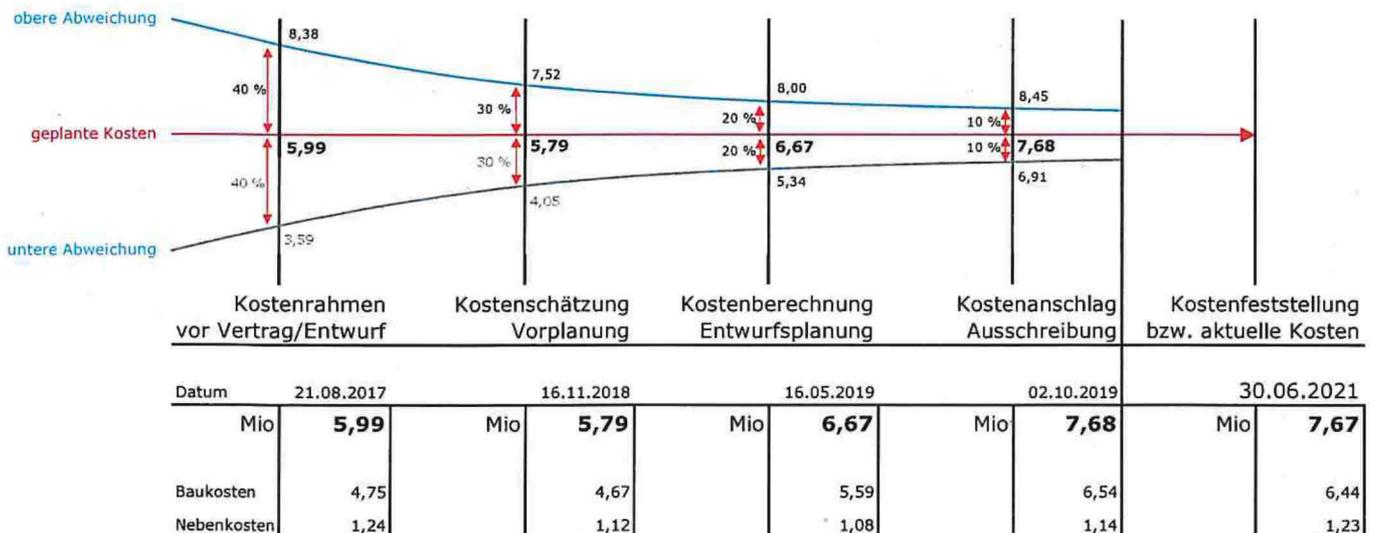

30.07.2021
