



Bildungshaus Norderstedt

Sachstand im Kulturausschuss

EGNO 

Entwicklungsgesellschaft
Norderstedt mbH

Bildungshaus Norderstedt


Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Ein Blick hinter die Kulissen




Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

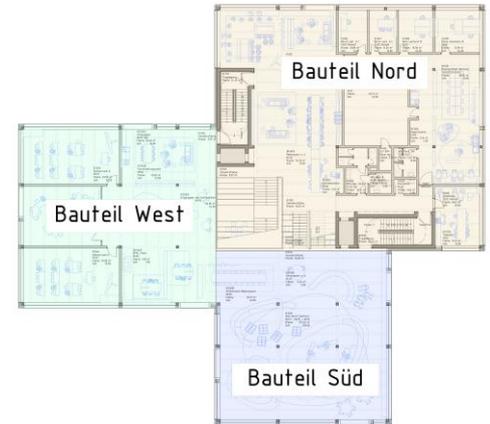


Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

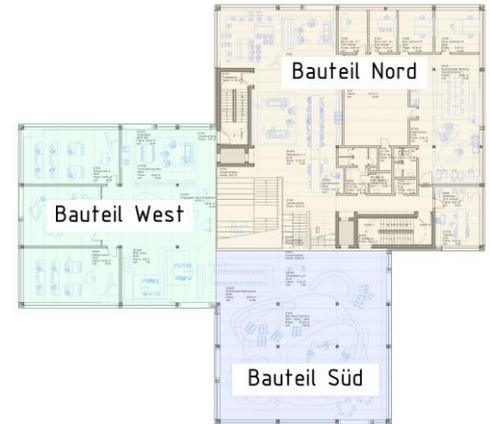

Bildungshaus Norderstedt


Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

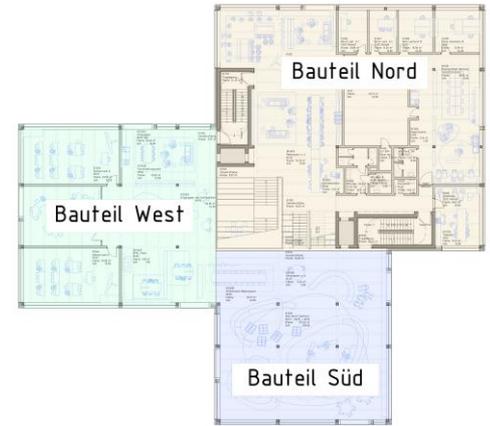

Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Bauteil West EG - Veranstaltungssaal

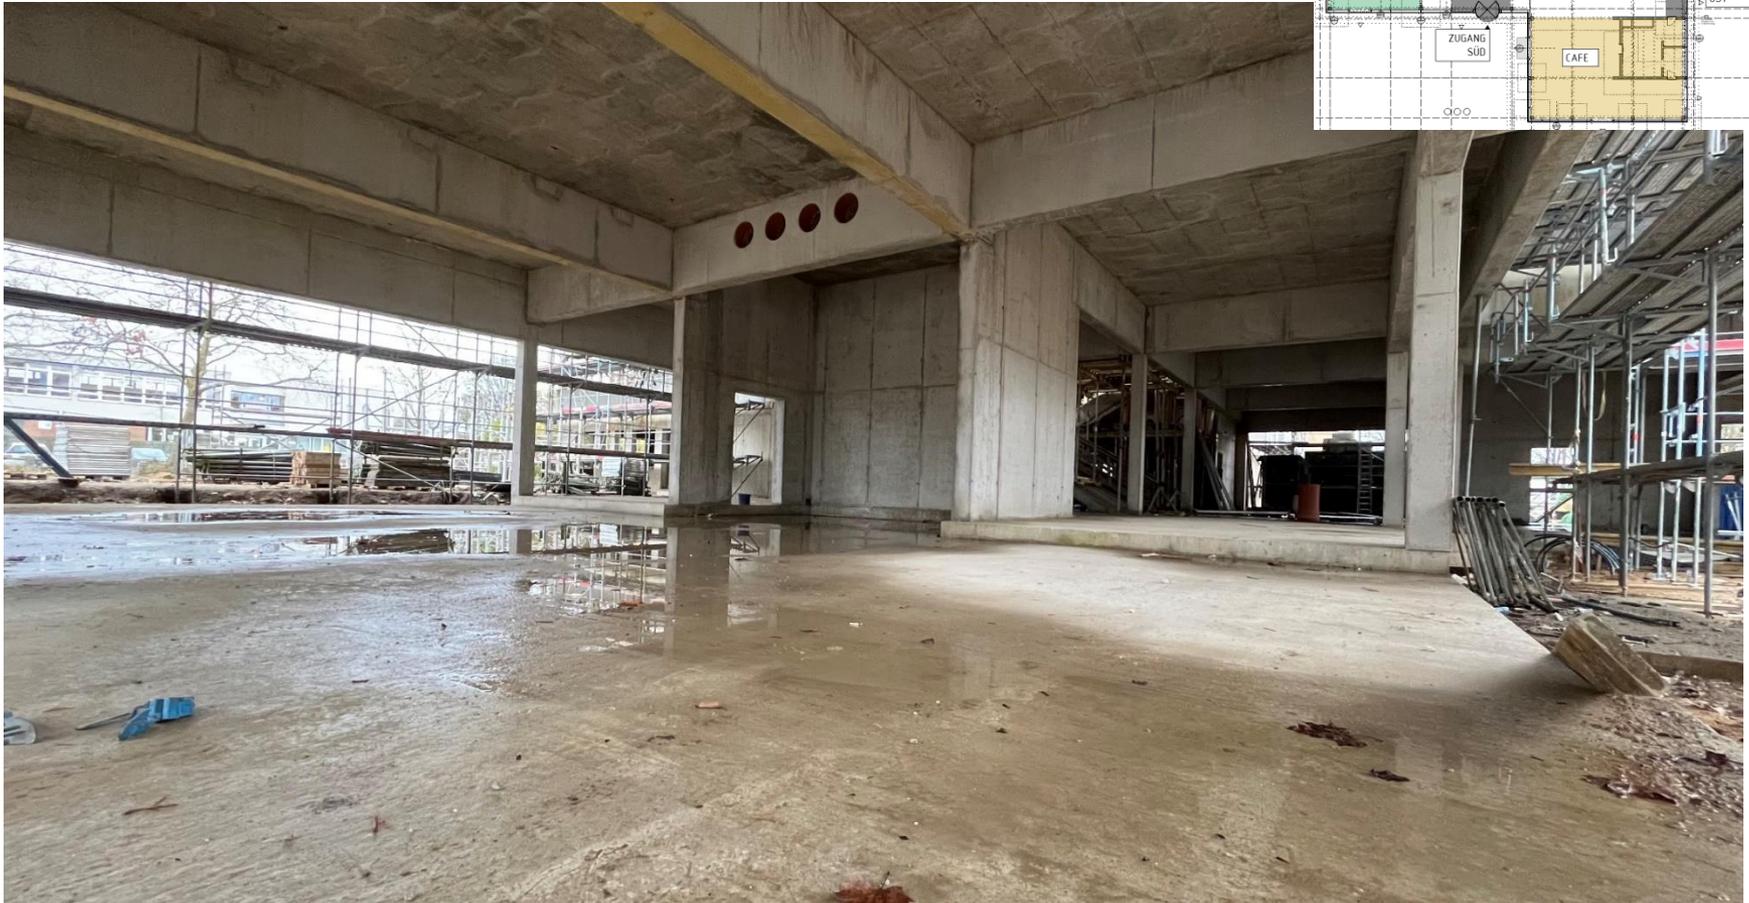

Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau


Bauteil West 1. OG – VHS Seminarräume



Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Bauteil Nord 1. OG – Verwaltung Bibliothek

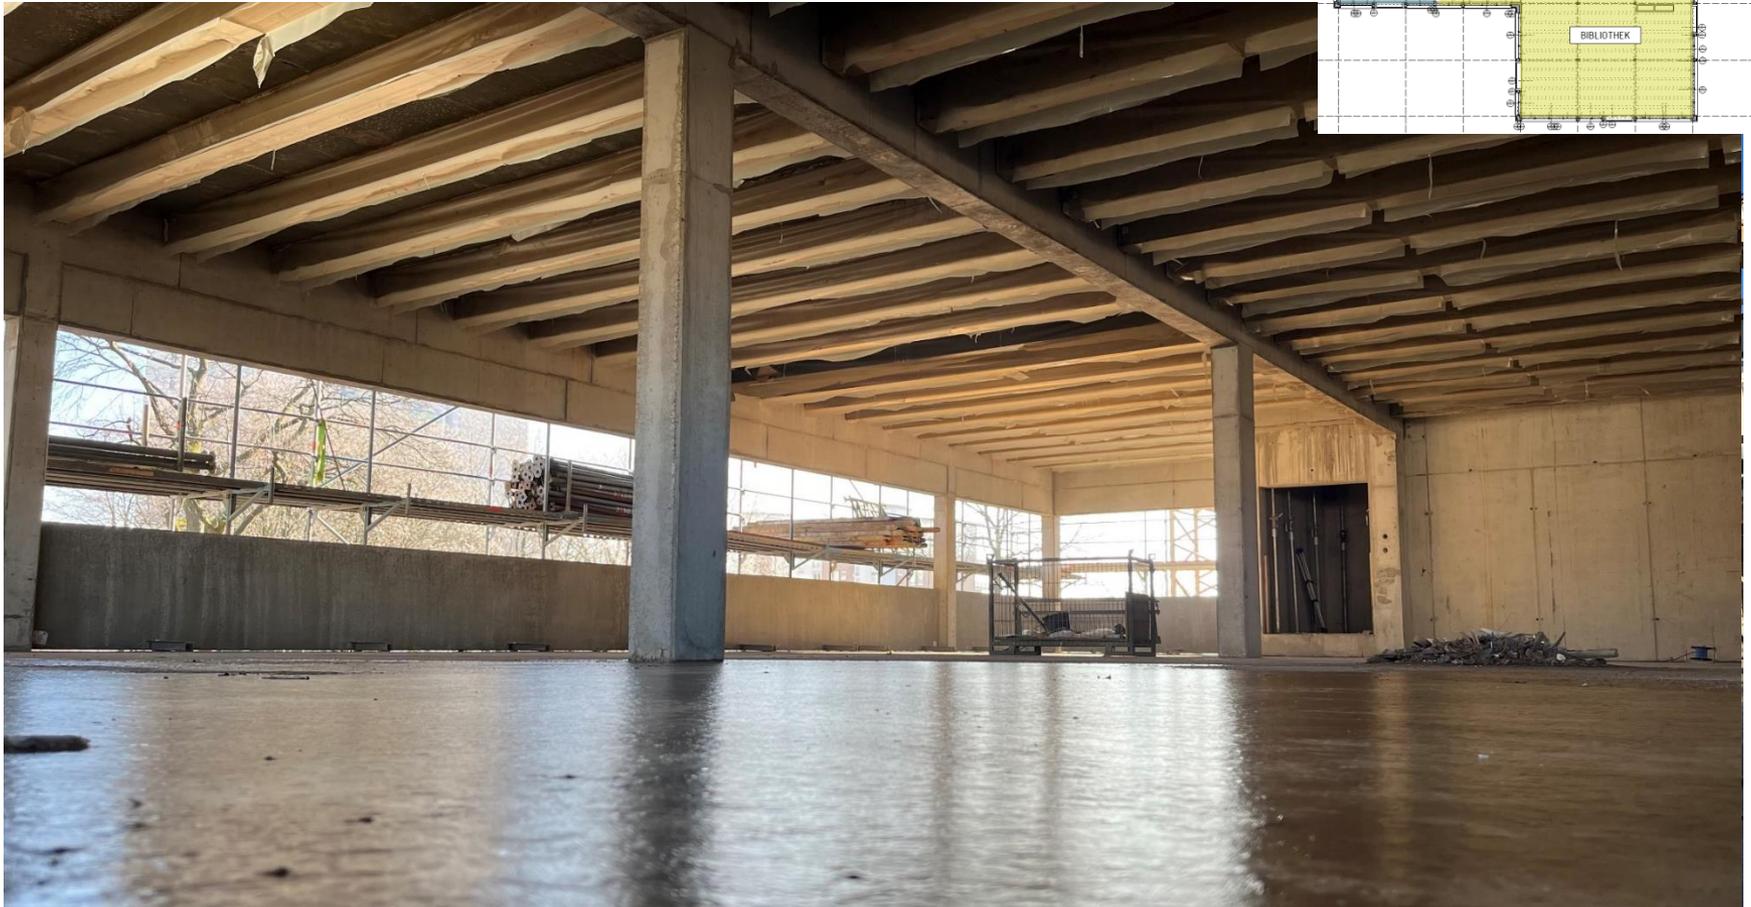

Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Decke – Stahlbetonstützen und -träger – Holzbalken - Deckenschalung



Bildungshaus Norderstedt



Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Nebentreppenhaus und Bildungstreppe



Verbindungsmitel


Betonfertigteile der Brüstung

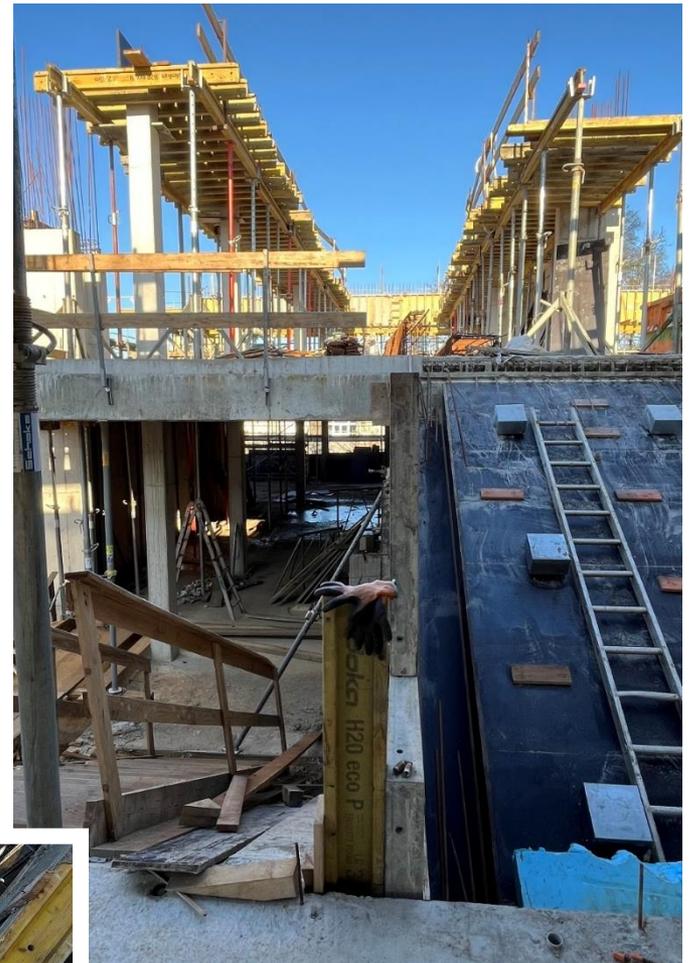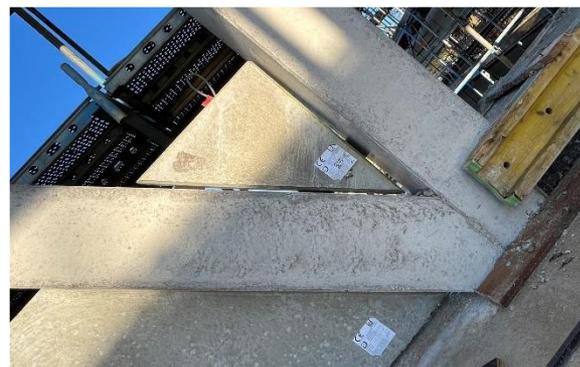

Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Bildungstreppe November 2024

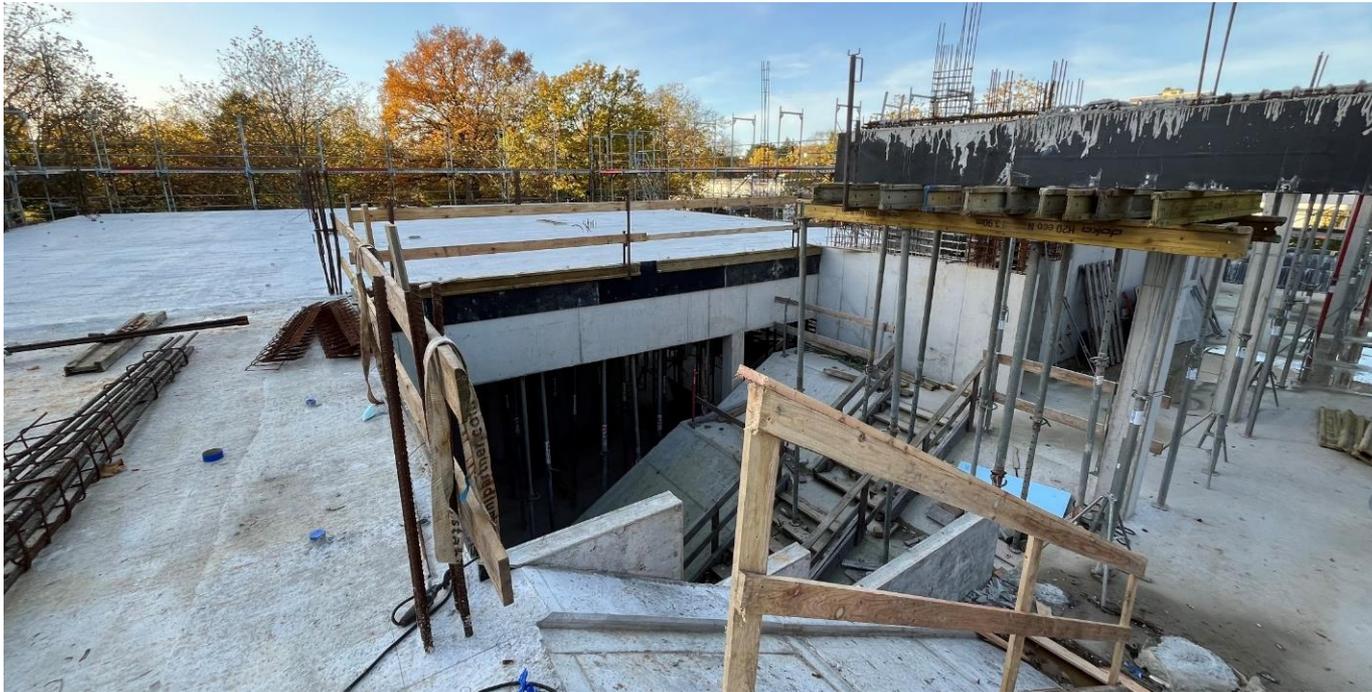

Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau


Bildungstreppe Januar 2025



Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Bauteil West und Süd – Decke über dem 1. OG

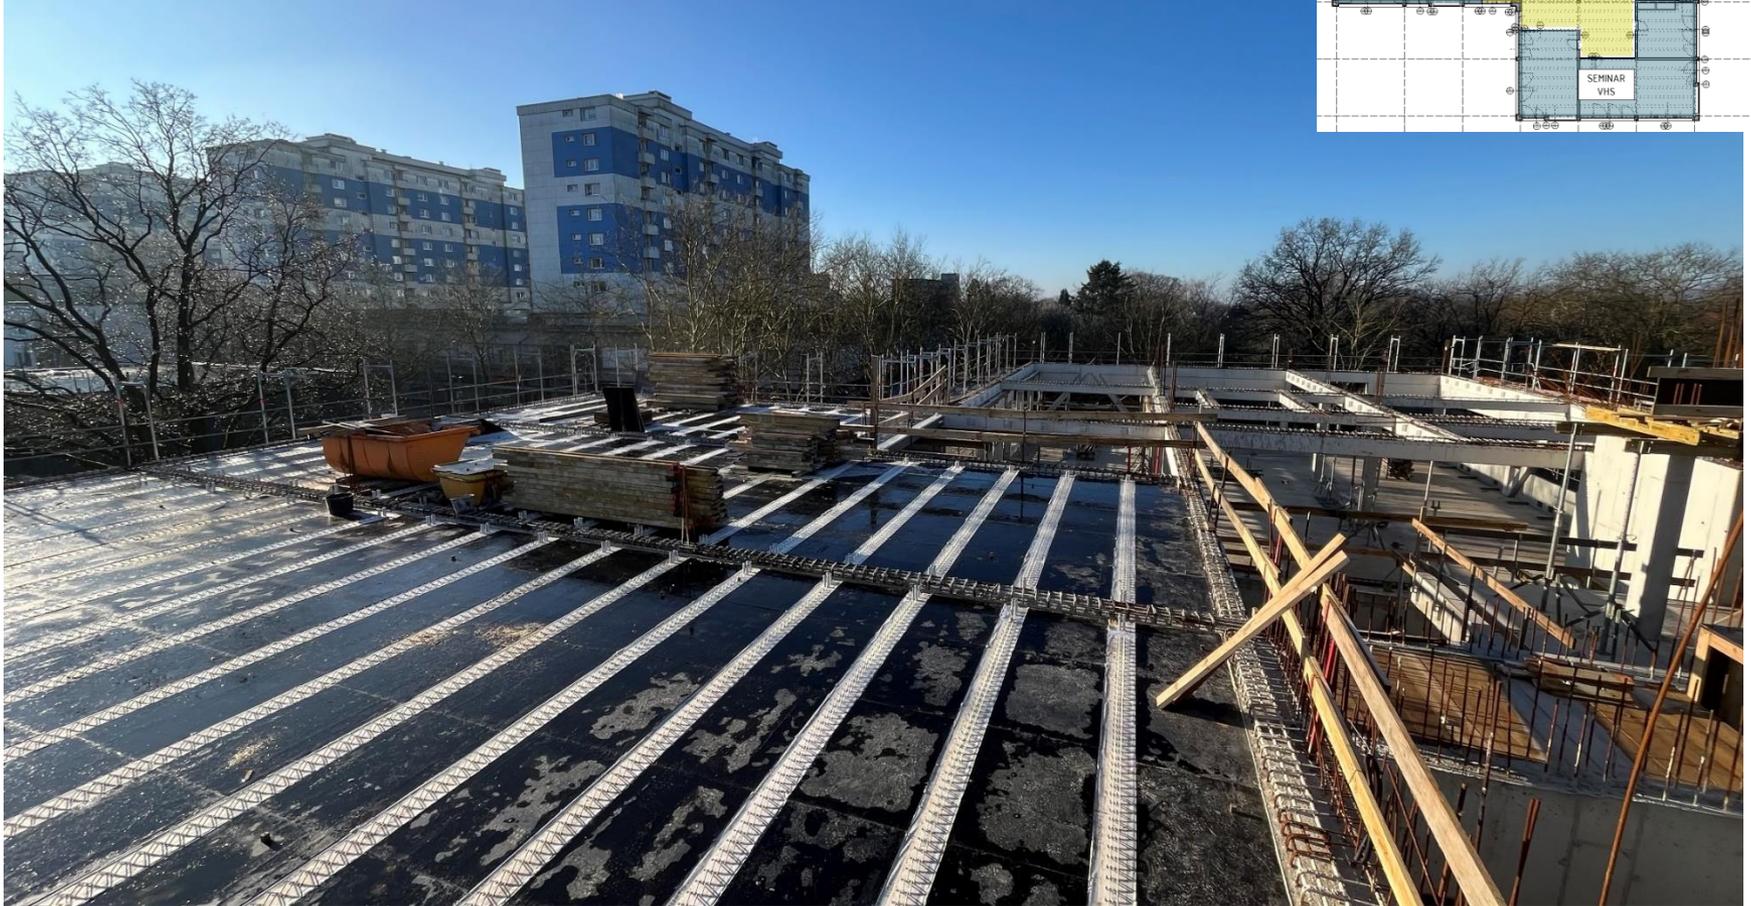

Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Terminprognose Januar 2025

Terminprognose zur Grundsteinlegung

Der zur Grundsteinlegung verschobene Eröffnungstermin in Q2/2026 basierte auf einer prognostizierten, verzögerten Fertigstellung des Rohbaus im November 2024.

Terminprognose Januar 2025

Die Rohbaufertigstellung ist aktuell weiter verzögert. Derzeit werden hierzu Verhandlungen geführt und Beschleunigungsmaßnahmen geprüft.

Der mögliche Beginn der Arbeiten der Anschlussgewerke ist derzeit ebenfalls in Prüfung und hängt von dem Meilenstein „Fertigstellung der Gebäudehülle inkl. Bauwerksabdichtung“ ab. Zudem muss das Gewerk Dachabdichtung erneut ausgeschrieben werden.

Bildungshaus Norderstedt

Leistungsphase 6 bis 8 – Bauvergaben, im Bau

Fortsetzung folgt

