

Projektdaten


Neubau des Campus Glashütte in Norderstedt

meyer@egno.de

Poppenbütteler Straße 230

040-535 406 52

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte		21.11.2018
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AfSuS		03./17.03.2021
	Bauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren		Juli 2021
	Einreichung Bauantrag	Januar '24	08.01.2024
	Baubeginn Sporthallen und Schulen	● Frühjahr '25	10.06.2025
	Fertigstellung Sporthallen 1.BA	● Herbst '26	
	Fertigstellung Sporthallen 2.BA	● Winter '27	
	Fertigstellung Schulen	● Winter '27	
	Gesamtfertigstellung	● Herbst '29	




Projektstatus

- Baustelle ist vollständig eingerichtet worden (Baucontainer, Bauzäune, Baustrom, Bauwasser)
- Sporthalle 1.BA Staus "Gebäude dicht" erreicht
- Sporthalle 1.BA Ausbaugewerke tätig
- Rohbauarbeiten Schule nach witterungsbedingter Unterbrechung fortgesetzt
- Beauftragung weiterer Ausbaugewerke erfolgt
- regelmäßige Einbindung der Bauherrenvertretung in den Planungs- und Bauprozess
- regelmäßige Abstimmungen mit den Planern, Nutzern und bei Bedarf mit dem Amt 68

Projektkosten

Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

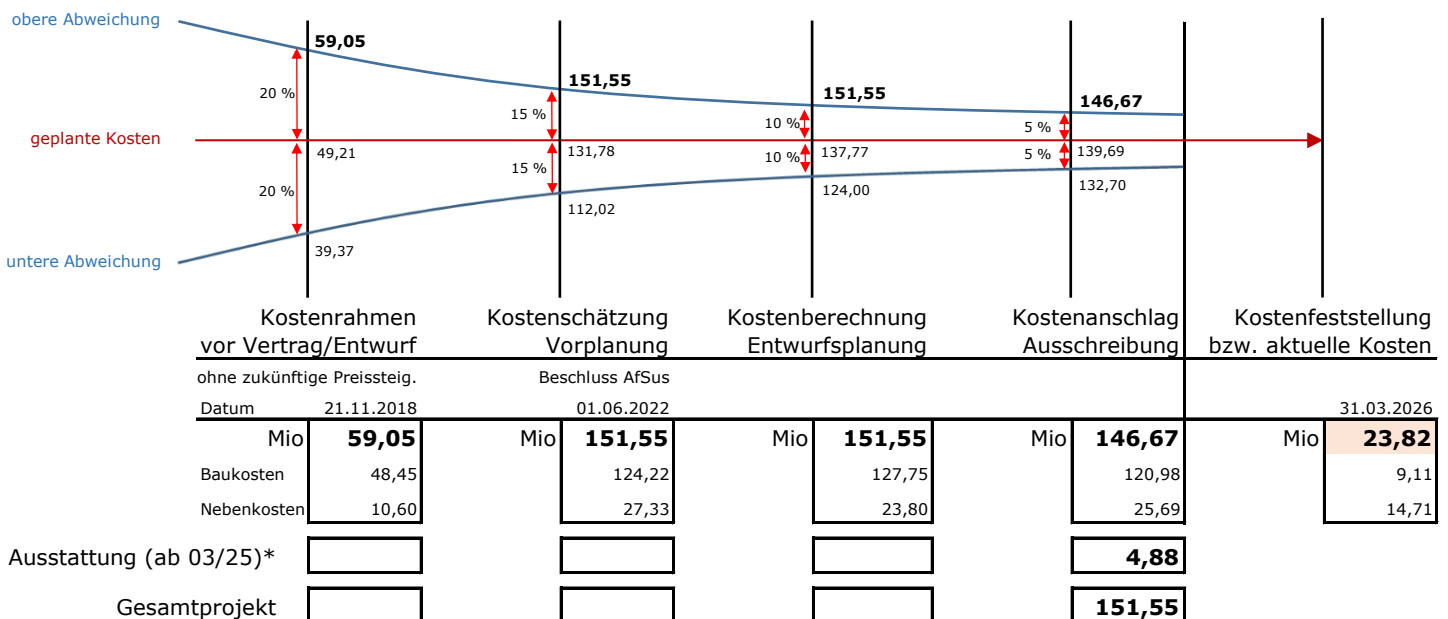

*Die Aufteilung des Kostenrahmens in Bau und Ausstattung ist nach Abstimmung mit dem Amt 42 erfolgt.
