

Projektdaten


Neubau des Campus Glashütte in Norderstedt

meyer@egno.de

Poppenbütteler Straße 230

040-535 406 52


Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte		21.11.2018
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AfSuS		03./17.03.2021
	Beauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren		Juli 2021
	Einreichung Bauantrag	● Januar '24	08.01.2024
	Baubeginn Sporthallen und Schulen	● Herbst '24	
	Fertigstellung Sporthallen	● Sommer '27	
	Fertigstellung Schulen	● Sommer '27	
	Gesamtfertigstellung	● Winter '28	



Projektstatus

- Einreichung Bauantrag am 08.01.2024 erfolgt
- Erstellung Ausführungsplanung seit dem 01.12.2023
- Vorbereitung Veröffentlichung erster Ausschreibungen
- regelmäßige Einbindung der Bauherrenvertretung in den Planungsprozess
- regelmäßige Abstimmungen mit den Stadtwerken zu Leitungsumverlegungen
- regelmäßige Abstimmungen mit den Planern, Nutzern und Amt 68
- Auslegung B-Plan abgeschlossen, Abwägung Stellungnahmen durch Verwaltung

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

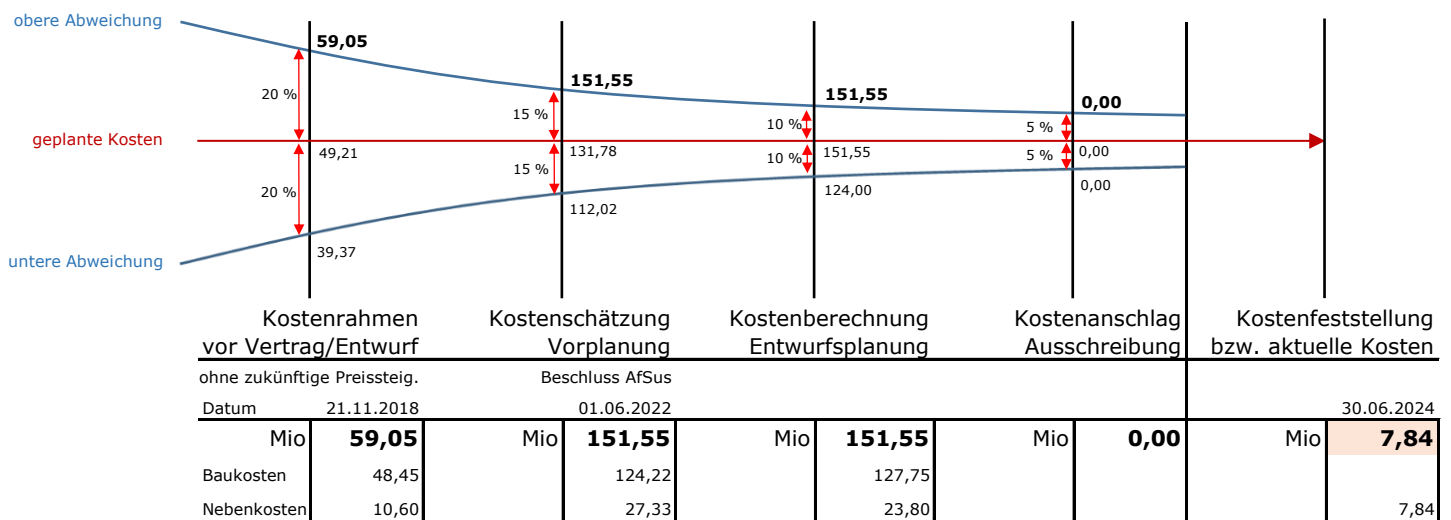

02.08.2024
